

◇広島駅南口整備 工事だより◇

広島駅南口広場の再整備等における駅前大橋線橋りょう等新設工事

2025年8月

広島電鉄(株) 駅前プロジェクト推進部



【みなさまへ】

平素から本事業にご協力を頂き、ありがとうございます。
月末を目途に、翌月の工事予定と合わせて工事の状況をみなさまにお知らせしています。
騒音にも十分に留意し、様々な対策を講じた上で安全第一で工事を進めてまいりますので、引き続きご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。

現場状況

2025年8月3日に駅前大橋ルートがいよいよ開業します。路面電車が広島新駅ビル2階に乗入れ、新しい運行が始まります。
現在、電車設備等の最終確認と運転士の習熟運転を行っています。
また、駅前広場ではペDESTリアンデッキ等の工事を行い、今後は循環ルートの軌道及び道路整備も順次進めていきます。



駅前周辺 及び 駅前通り

西ヤード (旧バス乗り場)



Aペデ架設用バント組立 (桁地組)

Aペデ 西ヤード内 橋桁組立状況

西ヤード (旧バス乗り場)



Aペデ 大州通り用橋桁 ボルト締め・塗装状況

現広島電島駅(東ヤード)



8月4日(月)～ 取壊しを行います

Bペデ (Bブロック地区)



Bペデ(歩道橋) 既設構造物取壊し作業中

駅前大橋ルート開業後は現広島電島駅の取壊し等を行い、歩道橋等の整備を行っていきます。
今後も交通規制や騒音等で御迷惑をお掛けしますが、ご協力の程よろしくお願ひいたします。

アンケートへの協力をお願い

回答結果は今後の参考にさせていただきます。
こちらから⇒



現場から一言

駅前大橋ルート 運輸開始前検査 合格！


7月9～11日の3日間にわたり駅前大橋ルート開業前の最終検査として国土交通省及び広島市の運輸開始前検査が実施されました。
この検査では計画通りに工事が実施されているか、また保安上支障がないか等の確認が行われ『予定通り開業しても問題ない』と評価されました。
今後は習熟運転を行いながら、最終チェックを行い開業を迎えます。



『運輸開始前検査 受検状況』
レール高さと構造物との離れ
などを確認



新路線図 お披露目

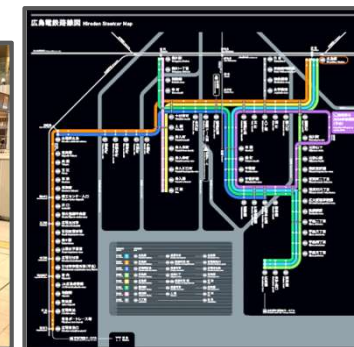

今後も工事は続きます。道路規制や騒音等でご迷惑をお掛けしますが、ご協力の程よろしくお願ひいたします。

■広島駅南口広場の再整備等における駅前大橋線橋りょう等新設工事
広島電鉄(株) 電車事業本部 駅前プロジェクト推進部
(施工者：大林組・広電建設・広成建設 広島電島共同企業体)

工事場所

地上部 平面図



※駅前大橋の改修に伴い、アンダーパスを通行止にしています。
ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

工程表

工 事 内 容	7月		2025年8月								9月		備考
	26	31	1	5	10	15	20	25	31	1	5		
① 駅部・地下広場他	←夏季休暇→												
② 西ヤード(旧バス乗り場) Aペデ(歩道橋関連)													
③ 東ヤード(現広島電島駅) Bペデ(歩道橋関連)													
④ 駅前大橋ルート													
⑤ 循環ルート													


凡例

- 昼間作業
- 夜間作業

※①騒音対策を行い昼夜作業します。

- ②可能な限り昼間に行いますが、一般交通・路面電車の通行等に支障を来たす場合は夜間に行います。
- ③可能な限り昼間に行いますが、一般交通・路面電車の通行等に支障を来たす場合は夜間に行います。
- ④可能な限り昼間に行いますが、一般交通・路面電車の通行等に支障を来たす場合は夜間に行います。
- ⑤騒音対策を行い昼夜作業します。

地下部 平面図 (地下広場)

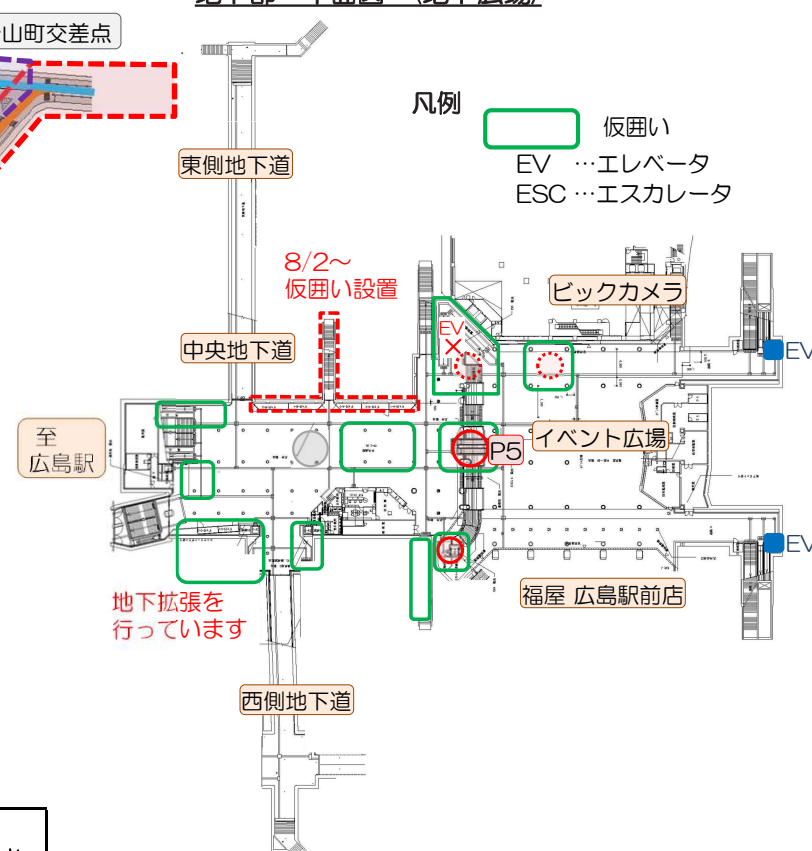

エレベータ停止や仮囲い増設に伴い、大変ご迷惑をお掛けしておりますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。

広島駅南口広場の再整備等 推進協議会

