

◇広島駅南口整備 工事だより◇

広島駅南口広場の再整備等における駅前大橋線橋りょう等新設工事

2026年2月

広島電鉄(株) 駅前プロジェクト推進部

【みなさまへ】

平素から本事業にご協力を頂き、ありがとうございます。
今月の工事予定と合わせて工事の状況をみなさまにお知らせしています。
騒音にも十分に留意し、様々な対策を講じた上で安全第一で工事を進めてまいりますので、引き続きご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。

現場状況

駅周辺ではペDESTリアンデッキの施工を進めています。エールエールA館とつなぐAペデでは、3月5日の利用開始を目指して屋根や床の仕上げなどを進めています。
的場～稲荷町交差点間では、循環ルートの軌道及び道路整備も順次進めています。また、駅前大橋ルートではレールが安定したため軌道部のコンクリート舗装を順次施工中です。

駅前周辺 及び 循環ルートほか

Aペデ (歩道橋)



Aペデ 階段部の屋根を施工中

Bペデ (歩道橋)



Bペデ 杭工事を施工中

循環ルート



的場停留場 床仕上げ施工中

駅前大橋ルート (松川町～比治山町交差点間)



軌道部のコンクリート舗装施工中

ペDESTリアンデッキ(歩道橋)や循環ルート区間の整備を行っています。
今後も交通規制や騒音等でご迷惑をお掛けしますが、ご協力の程よろしくお願いたします。

アンケートへの協力をお願い
回答結果は今後の参考にさせていただきます。
こちらから⇒



現場から一言

循環ルート 稲荷町停留場 上屋施工開始！

循環ルートの稲荷町停留場の上屋建て方を開始しました。
昨年までに基礎部・新設軌道レールの施工が完了し、年明けより上屋の施工に着手しています。現在供用開始している駅前大橋ルートの稲荷町停留場と同様に有効幅やスロープなどバリアフリー化を図りながらデザインにも配慮した停留場になります。



常設足場を設置して柱や屋根材の組み立てを行い、工程短縮を図っています。

← 作業状況(全景)

⇨ 足場上での組立作業


新しい停留場は、バリアフリー規格に適合しており、お客様の安全及び利便性が向上します。
また、照明はLEDのライン照明を採用し、省電力化を図りながら、温かみのある色が居心地の良い雰囲気を出します。




今後も工事は続きます。振動や騒音等でご迷惑をお掛けしますが、ご協力の程よろしくお願いたします。

■広島駅南口広場の再整備等における駅前大橋線橋りょう等新設工事
広島電鉄(株) 電車事業本部 駅前プロジェクト推進部
(施工者：大林組・広電建設・広成建設 広電広島駅共同企業体)

工事場所

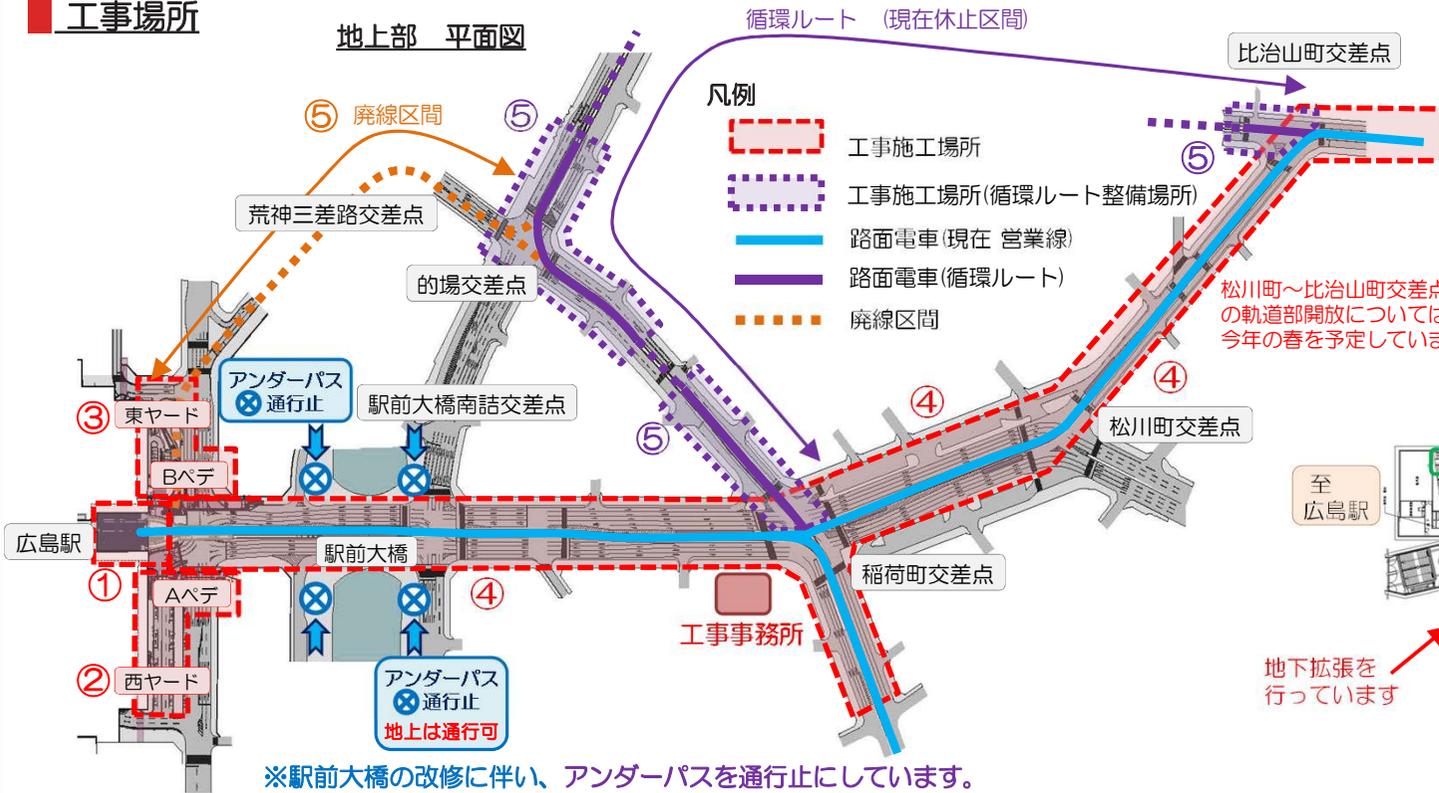

地下部 平面図 (地下広場)

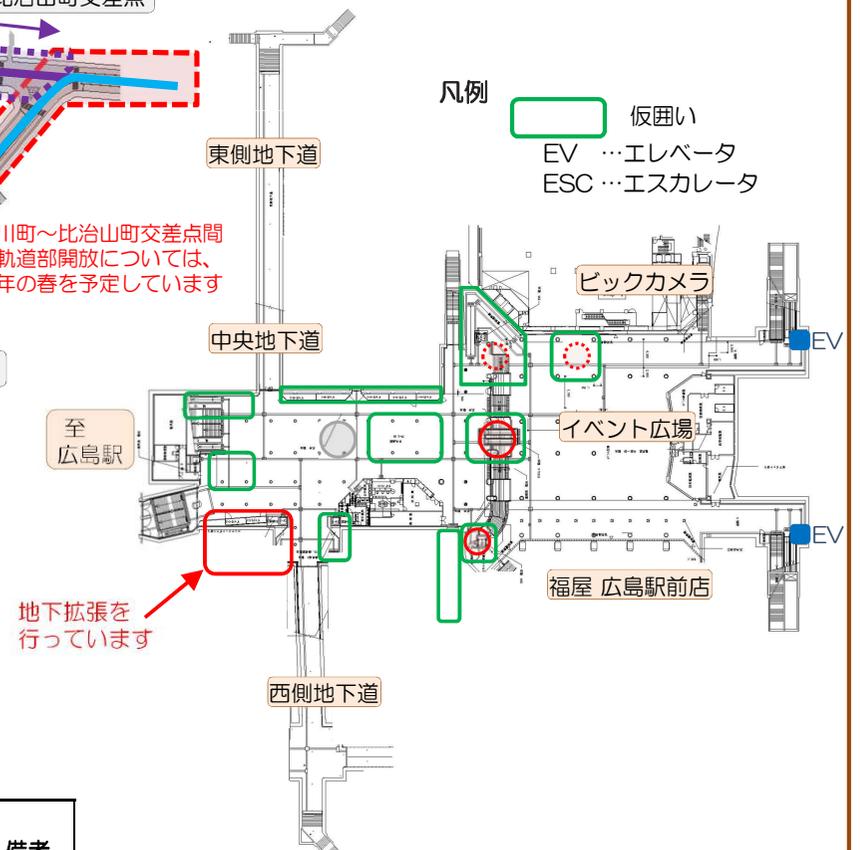

工程表

工事内容	1月		2026年2月								3月		備考
	26	31	1	5	10	15	20	25	28	1	5		
① 駅部・地下広場他	仮囲い内で作業継続中												
② 西ヤード(旧バス乗り場) Aペデ(歩道橋関連)	[作業期間]												
③ 東ヤード(旧広島島駅) Bペデ(歩道橋関連)	[作業期間]												
④ 駅前大橋ルート	[作業期間]												
⑤ 循環ルート他	[作業期間]												

凡例

- 昼間作業
- 夜間作業

- ※①騒音対策を行い昼夜作業します。
- ②可能な限り昼間に行いますが、一般交通・路面電車の通行等に支障を来たす場合は夜間に行います。
- ③可能な限り昼間に行いますが、一般交通・路面電車の通行等に支障を来たす場合は夜間に行います。
- ④一般交通・路面電車の通行等に支障を来たす場合は夜間に行います。
- ⑤騒音対策を行い昼夜作業します。

エレベータ停止や仮囲い増設に伴い、大変ご迷惑をお掛けしておりますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。

広島駅南口広場の再整備等 推進協議会

